# Bericht aktueller Planungsstand September 2016





#### ARBEITSSTAND:

**ENTWURFSPLANUNG VORGELEGT:** 

Ende Juli 2016

ANPASSUNGEN AUFGRUND VON WEITEREN ERKENNTNISSEN AM BAU:

Mitte August 2016

PROJEKTPRÄSENTATION IN SCHWERIN (LFI / Ministerium):

24. August 2016

- AUCH AUSSTATTUNG UND AUSWEICHLÖSUNG IN DEN GESAMTUMFANG RECHNERISCH EINBEZIEHEN
- NUR FESTE AUSSTATTUNG IST FÖRDERFÄHIG
- KOSTEN DER ANMIETUNG AUSWEICHLÖSUNG NICHT FÖRDERFÄHIG, JEDOCH DIE HERRICHTUNG DER FLÄCHEN
- WIEDERHERSTELLUNG DER AUSSENANLAGE KLEINSPIELFELD ARNDTSTRASSE FÖRDERFÄHIG!!

**EINREICHUNG BAUANTRAG:** 

Mitte September 2016

**ZUSAMMENSTELLUNG UNTERLAGEN FÖRDERANTRAG:** 

**Ende September 2016** 


WERKPLANUNG / VORBEREITUNG AUSSCHREIBUNG:


ab Anfang Oktober 2016

**BAUBEGINN GEPLANT:** 

Juli 2017



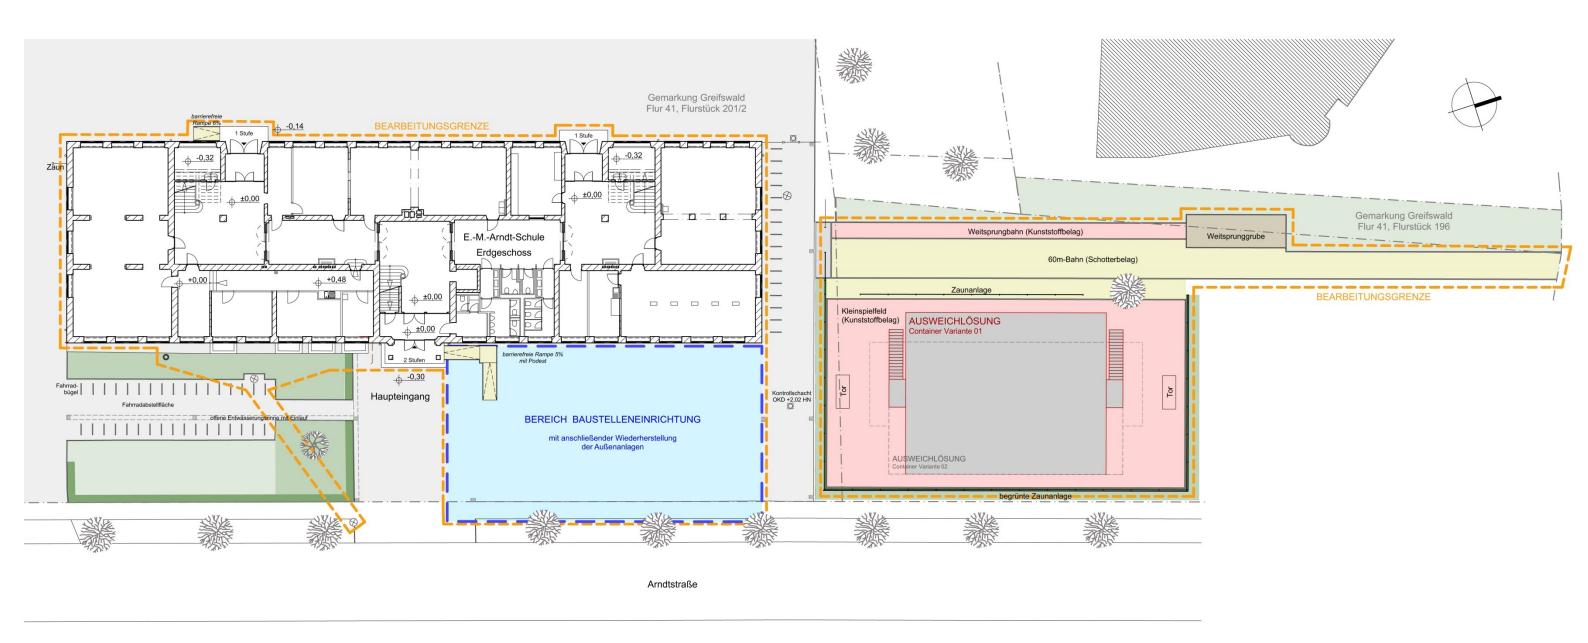

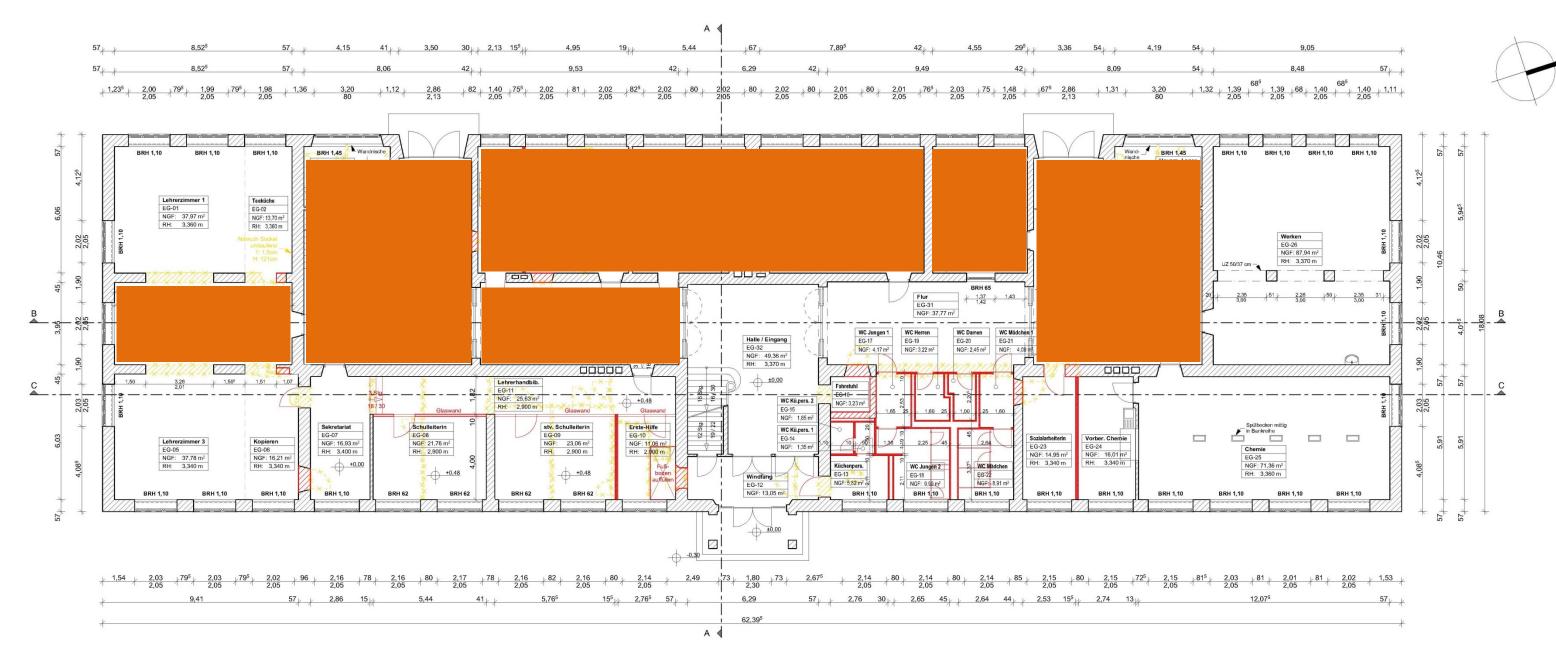

**ERDGESCHOSS** 







#### **KOSTENRAHMEN ALS ZWISCHENINFORMATION IM JUNI 2016**

# ca. 4.500.000,00 € - ca. 4.800.000,00 € (NUR GEBÄUDE)

- nicht enthalten waren Kosten für die Ausstattung des Gebäudes
- nicht enthalten waren Kosten für die geplante Ausweichlösung über 2 Jahre

### **ENDERGEBNIS DER KOSTENBERECHNUNG STAND 09/2016:**

# GESAMTKOSTEN INCL. AUSSTATTUNG UND KOSTEN FÜR DIE AUSWEICHLÖSUNG:

- davon für die feste und lose Ausstattung incl. Nebenkosten (Fachräume, Möbel, ...)
- davon für die temporäre Ausweichlösung incl. Nebenarbeiten

## **GESAMTKOSTEN GEBÄUDE**

- davon Anpassung Haustechnikkosten nach Vorliegen der entspr. Fachkosten
- davon Mehraufwendungen Austausch Sohlplatten EG

6.569.700,00 €

828.000,00 € 600.000,00 €

5.141.700,00 €

ca. 120.000,00 €

